

Expansion de GO

Quatrième voie à Kitchener et gare Bloor (Correspondance avec la TTC) Comité de liaison avec les équipes de construction

Le 10 avril 2025



ORDRE DU JOUR

- Reconnaissance du territoire
- Moment de sécurité
- Aperçu de l'expansion de GO
- Quatrième voie à Kitchener
 - Aperçu du projet
 - Calendrier du projet
 - Progression des travaux
 - À quoi s'attendre ensuite
- Correspondance vers les réseaux de la TTC à Bloor
 - Aperçu du projet
 - Calendrier du projet
 - Progression des travaux
 - À quoi s'attendre ensuite
- Discussion du comité
- Engagement communautaire

RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Metrolinx reconnaît que nous connectons des communautés en construisant et en exploitant le transport en commun sur les terres traditionnelles des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Wendat, pour qui ces terres continuent d'avoir une grande importance.

Les traités entre les Premières Nations et les gouvernements couvrent ces terres, et les promesses contenues dans ces traités demeurent pertinentes à ce jour.

Metrolinx et ses employés s'engagent à comprendre l'histoire de ces terres et les répercussions continues de la colonisation et prennent la responsabilité des actions visant à faire progresser la réconciliation.


Metrolinx continuera de rechercher les connaissances, l'expertise et l'expérience des partenaires autochtones et s'engage à mener ses activités d'une manière qui repose sur une base de confiance, de respect et de collaboration.



Moment de sécurité


Aperçu de l'expansion de GO

Le programme d'expansion de GO fournira une série d'améliorations dans toute la RGTH :

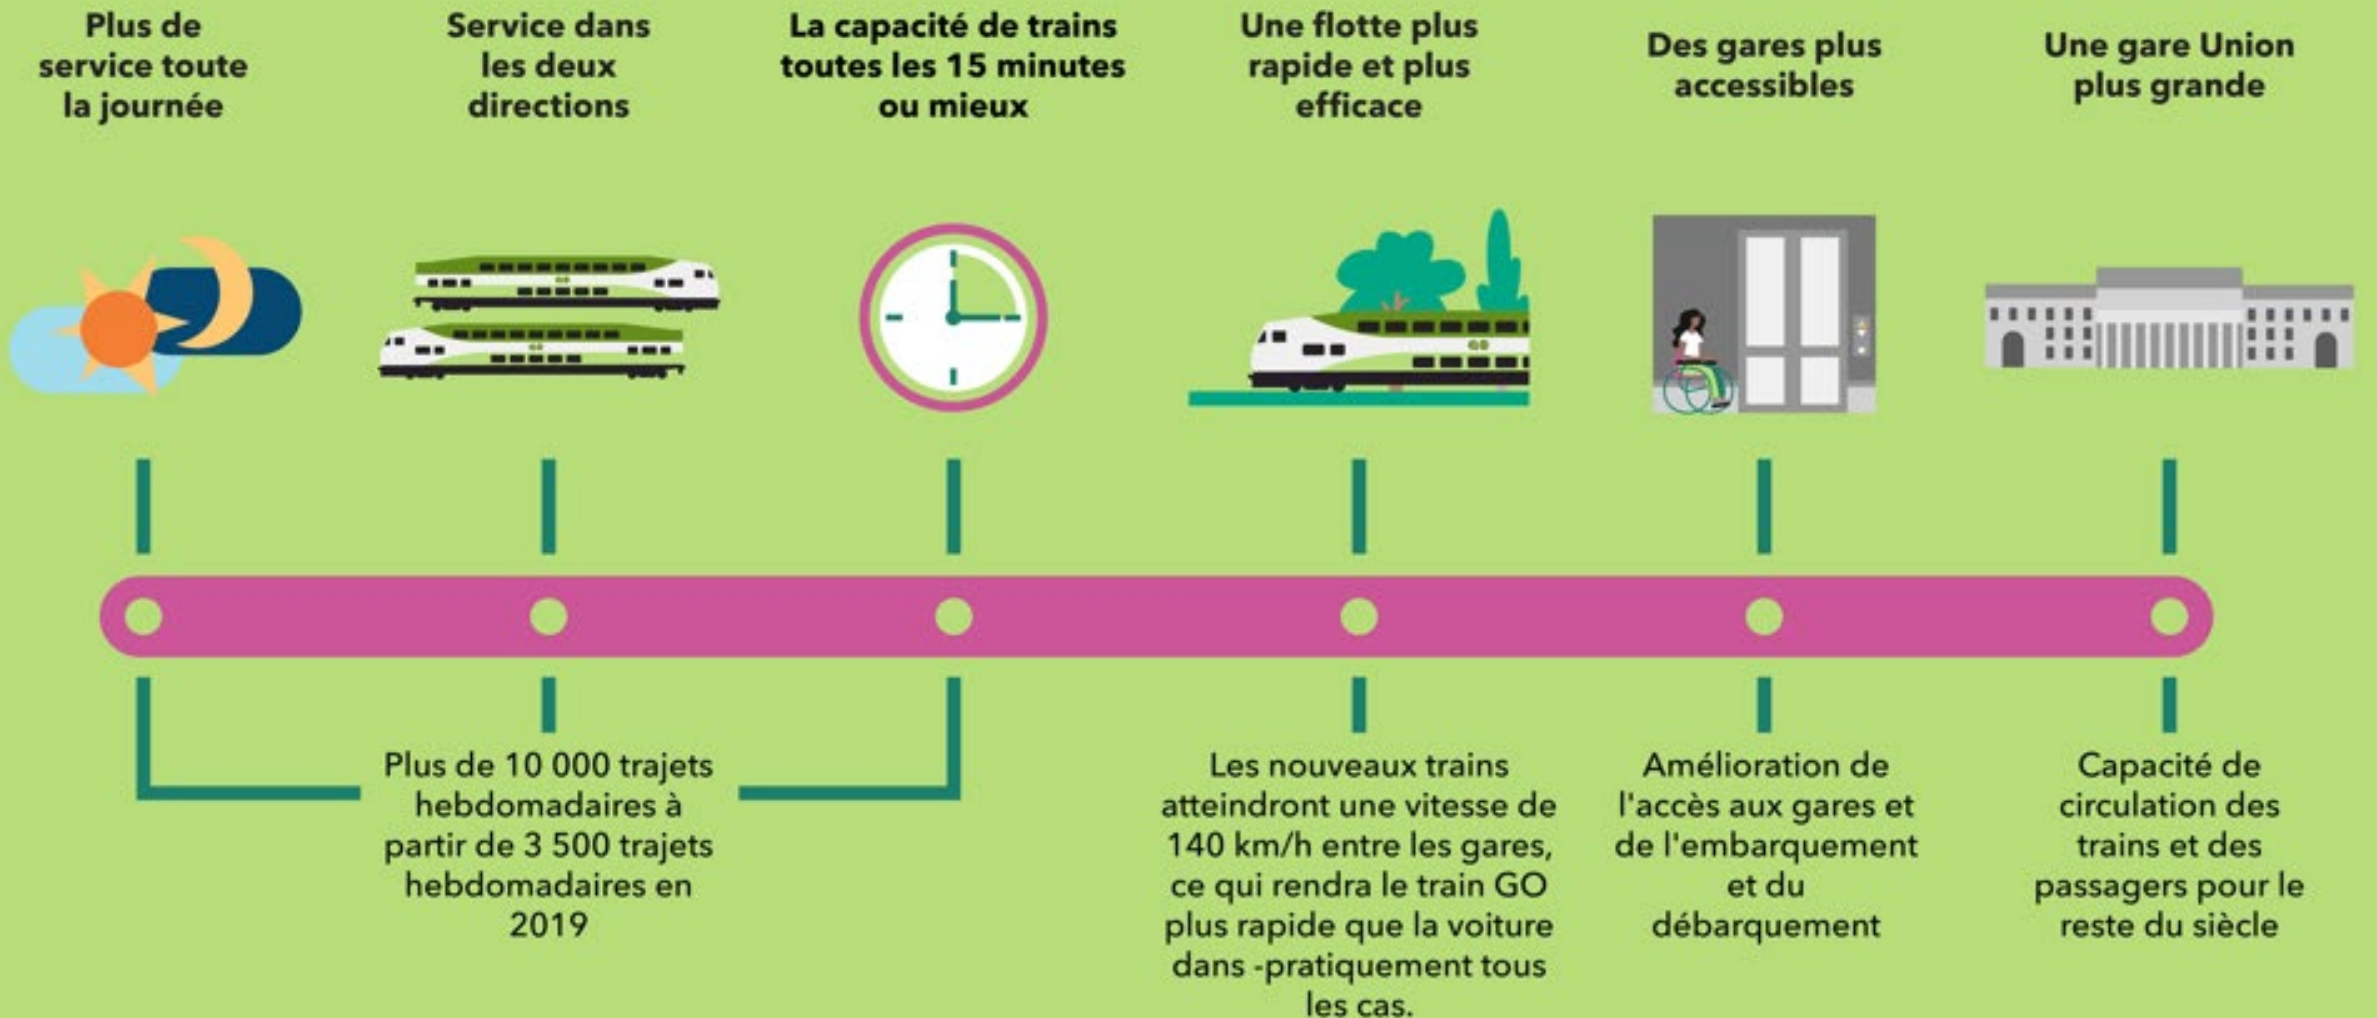

Mise à jour sur le projet de quatrième voie à Kitchener

Échéancier du projet

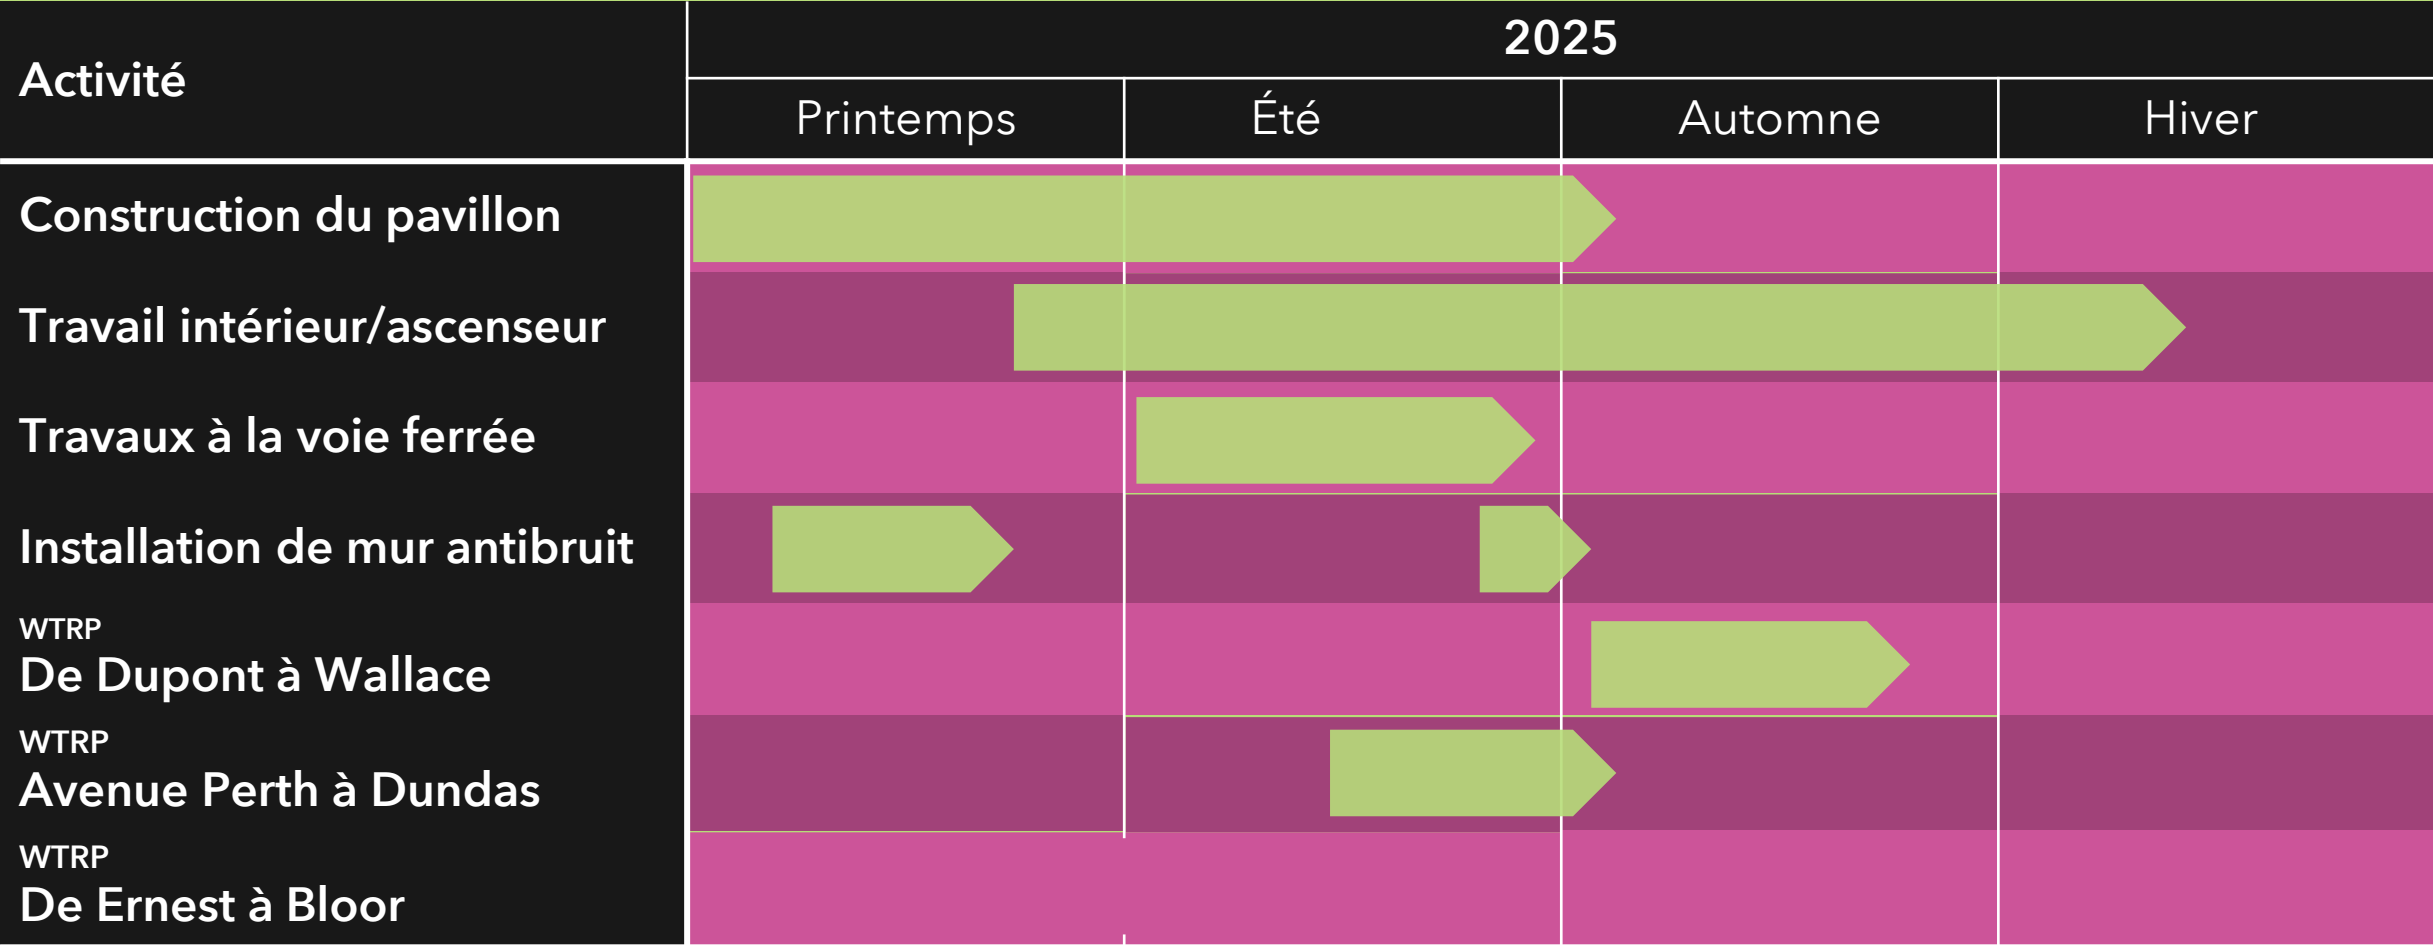

Cet échéancier peut être assujéti à des modifications en raison de conditions météorologiques ou de circonstances imprévues.

EN COURS

Installation de mur antibruit

- De l'avenue Randolph à l'avenue Ernest
- Travaux de nivellement
- Installation de la plateforme de la voie

Tunnel et pavillon de la gare GO de Bloor

- Plomberie
- Cadrage
- Travaux électriques



TERMINÉ

Raccordement au tunnel existant

- Travaux de bétonnage achevés

Pavillon piétonnier

- Montage de la structure en acier



À QUOI S'ATTENDRE ENSUITE

Tunnel et pavillon de la gare GO de Bloor

- Installation du
platelage
- Peinture
- Imperméabilisation



À QUOI S'ATTENDRE ENSUITE

Améliorations des voies à la gare GO de Bloor

- Travaux de nuit dès mai
- Installation de paliers de support pour s'assurer que la voie est à la bonne hauteur et à la bonne distance des quais
- Travail effectué avec des outils manuels



Mise à jour sur le projet de correspondance de la gare Bloor avec la TTC

ÉCHÉANCIER DU PROJET

Activité	2024	2025				2026	
	Automne	Hiver	Printemps	Été	Automne	Hiver	Printemps
Nouvelle structure piétonnière en boîte							
Travaux du bâtiment Crossway							
Travaux de la station de la TTC							

Cet échéancier peut être assujéti à des modifications en raison de conditions météorologiques ou de circonstances imprévues.

EN COURS

Injection de coulis

- À la structure piétonnière en boîte



EN COURS

Protection de l'environnement

- Réparations de la clôture à neige en raison de dommages causés par le déneigement effectué par des entreprises avoisinantes.



EN COURS

Installation de conduits à la gare Dundas Ouest


- Installation du conduit pour les câbles d'alimentation et de communication du système d'alarme incendie.

Calendrier des travaux

- L'installation de conduits est prévue pendant la nuit, du lundi au vendredi, de 2 h à 5 h.

Répercussions sur la communauté

- Aucune incidence sur la communauté puisque les travaux sont effectués pendant les heures de pointe.

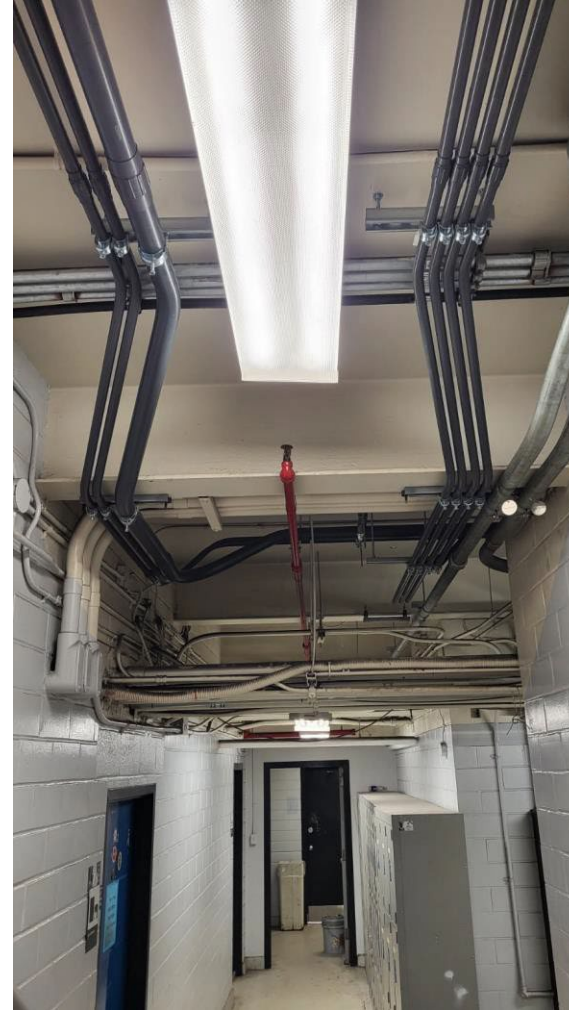

EN COURS

Réparations du plafond au niveau P2

Calendrier des travaux

- Les travaux sont prévus en journée, du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h.

Répercussions sur la communauté :

- Tous les travaux seront contenus dans la zone réservée.
- Aucune incidence sonore.



À QUOI S'ATTENDRE ENSUITE

Installation du générateur au débarcadère de la gare GO de Bloor

Calendrier des travaux

- La livraison du générateur est prévue pendant les heures non achalandées

Répercussions sur la communauté :

- Tous les travaux seront dans la zone réservée. Le contrôle de la circulation sera mis en œuvre et des signaux appropriés seront affichés pendant la durée des travaux.



Discussion du comité

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Des mises à jour seront communiquées à la communauté par :

- Délais de livraison de Postes Canada
- Bulletin d'information électronique bimensuel de Toronto Ouest
- Site Web du projet (metrolinx.com/kitchener)
- Réunion mensuelle du Comité de liaison avec les équipes de construction (CLEC)
- Réunions publiques virtuelles et en personne
- Kiosques d'information communautaires
- Numéro de téléphone de Toronto Ouest : 416-202-6911
- Courriel de Toronto Ouest : TorontoWest@metrolinx.com
- X : @GOExpansion
- Metrolinx Participez

This presentation is available in English upon request. If interested, please send an email to

 TorontoWest@metrolinx.com

MISE À JOUR SUR LA CORRESPONDANCE
AVEC LA TTC

