


Lakeshore Est : Travaux de construction en cours

Novembre 2023 - Janvier 2026

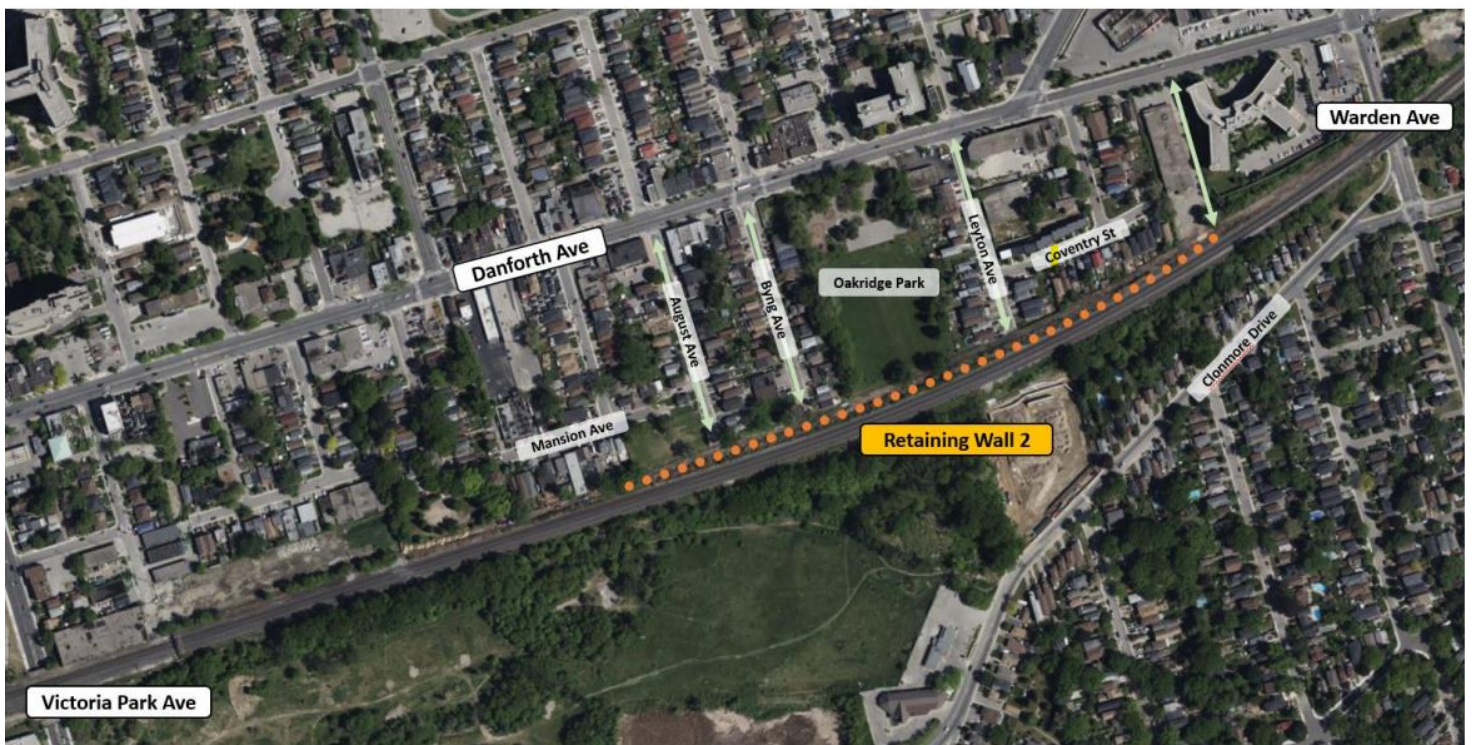

Travaux de construction en cours

À la mi-novembre, les équipes ont commencé les travaux de construction le long du corridor ferroviaire entre l'avenue Mansion/le parc Kenworthy et la rue Coventry pour construire le mur de soutènement 2 (voir le plan ci-dessus).

Nous effectuons actuellement des travaux d'amélioration du sol avant les travaux d'étaiyage et de pieux temporaires, des travaux de terrassement et de compactage sur toute la ligne du mur en préparation de la construction du mur permanent. L'étaiyage temporaire devrait commencer dès la mi-février.

Le mur de soutènement définitif sera ensuite construit et sera constitué d'unités de béton préfabriquées qui seront livrées sur le site en empruntant les routes locales.

| Activités de construction | Date de début provisoire | Durée prévue | Heures des travaux | À quoi s'attendre |
|--|--------------------------|--------------|----------------------------|---|
| Étayage/pose de pieux temporaire | Mi-février | 13 mois | Travaux de jour et de nuit | Il y aura une augmentation du trafic de construction sur les routes locales et l'activité de pose de pieux et de compactage de la terre pourrait avoir des effets mineurs perceptibles pour les propriétés voisines sous la forme de bruits et de vibrations. |
| Remarque : toutes les dates et tous les délais sont approximatifs. | | | | |

Qu'est-ce que cela signifie pour vous?

Des précautions raisonnables seront prises pour réduire au minimum les répercussions sur la collectivité locale, mais il se peut que vous remarquiez un nombre accru de véhicules de construction à proximité du chantier, ainsi que du bruit, de la boue et l'éclairage du site.

Nous limiterons la marche au ralenti de l'équipement non essentiel afin de réduire le bruit, de limiter les opérations de marche arrière et nous éloignerons les feux des fenêtres résidentielles autant que possible. Une surveillance du bruit et des vibrations sera également mise en place pour s'assurer que les niveaux de bruit demeurent dans les limites de l'acceptable.

Heures des travaux :

Les travaux énumérés ci-dessus comprendront un agencement de travaux diurnes et nocturnes, et des travaux à effectuer durant les fins de semaine peuvent être requis périodiquement. Les travaux du quart de jour auront lieu entre 7 h et 19 h cinq (5) jours par semaine (du lundi au vendredi) et les travaux du quart de nuit, au besoin, auront lieu entre 19 h et 7 h cinq (5) jours par semaine (du dimanche au jeudi). Veuillez faire preuve de prudence autour des chantiers de construction en cours. Nous nous excusons des inconvénients.

Pourquoi devons-nous faire cela?

Des travaux de construction sont en cours le long du corridor ferroviaire de Lakeshore East afin de répondre aux besoins des futurs services ferroviaires de GO Transit. Le service futur exige l'ajout d'une quatrième voie ferrée et l'installation de l'électrification des lignes aériennes pour des trains plus rapides et plus efficaces.

Questions Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce travail, veuillez communiquer avec nous en tout temps à TorontoEast@metrolinx.com. Pour de plus amples

Comme pour tout projet de construction, les travaux peuvent être modifiés, reportés ou prolongés en raison des conditions météorologiques ou de circonstances imprévues.

This construction notice is available in English upon request. If you are interested, send us an email at: Torontowest@metrolinx.com

Contactez-nous :

Écrivez-nous à l'adresse suivante : TorontoEast@metrolinx.com

Retrouvez-nous sur Twitter [@Metrolinx](https://twitter.com/Metrolinx)

Visitez le site Web : <https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-lakeshore-est>

Balayez le code QR à droite pour recevoir les dernières nouvelles sur l'expansion de la ligne GO de Lakeshore East sur votre dispositif à l'aide de Twitter.



renseignements sur l'expansion de GO dans votre communauté, visitez notre site Web à l'adresse <https://www.metrolinx.com/fr>.

Comme pour tout projet de construction, les travaux peuvent être modifiés, reportés ou prolongés en raison des conditions météorologiques ou de circonstances imprévues.

This construction notice is available in English upon request.
If you are interested, send us an email at: Torontowest@metrolinx.com

Contactez-nous :

Écrivez-nous à l'adresse suivante : TorontoEast@metrolinx.com

Retrouvez-nous sur Twitter [@Metrolinx](https://twitter.com/Metrolinx)

Visitez le site Web : <https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-lakeshore-est>

Balayez le code QR à droite pour recevoir les dernières nouvelles sur l'expansion de la ligne GO de Lakeshore East sur votre dispositif à l'aide de Twitter.

