

## Expansion de GO – Toronto Ouest

### Mise à jour sur les travaux de construction

Créée le : 2026-02-12

---

#### 1. Aperçu

### Mise à jour mensuelle sur les travaux de construction - Voie verte du saut-de-mouton de Davenport

**Date :** Le 3 mars 2026

Le présent document présente un point mensuel sur les travaux du projet de construction de la voie verte du saut-de-mouton de Davenport. Il comprend un résumé des travaux réalisés au cours du mois écoulé, des activités à venir ou en cours, ainsi que des éventuelles répercussions sur la communauté dont les résidents et les commerces doivent être informés.

---

#### 2. Travaux récemment terminés

**Activité terminée n° 1 :** Travaux sur les réseaux, notamment l'installation de la conduite d'eau principale, d'un chemin de câbles et de socles de poteaux. Les équipes ont également achevé l'installation d'une conduite d'eau principale aux avenues Wallace et Sarnia (terminé au 4<sup>e</sup> trimestre 2025)

**Activité terminée n° 2 :** La démolition du trottoir actuel de la rue Dupont a commencé en novembre 2025



N° 1 Travaux de drainage et de voirie dans le corridor




N° 2 Démolition du trottoir sur la rue Dupont (côté ouest)

**Activité terminée n° 3 :** Construction d'une route d'accès temporaire et mise en place de barrières de chantier près du croissant Turntable et du chemin Davenport (terminé en janvier 2026)

**Activité terminée n° 4 :** Réouverture temporaire du passage souterrain du chemin Paton (terminé en janvier 2026)

**Activité terminée n° 5 :** Achèvement des premiers travaux de micropieux destinés à soutenir la nouvelle passerelle piétonne et les structures de la rampe en épingle à cheveux (terminés en mars 2026)

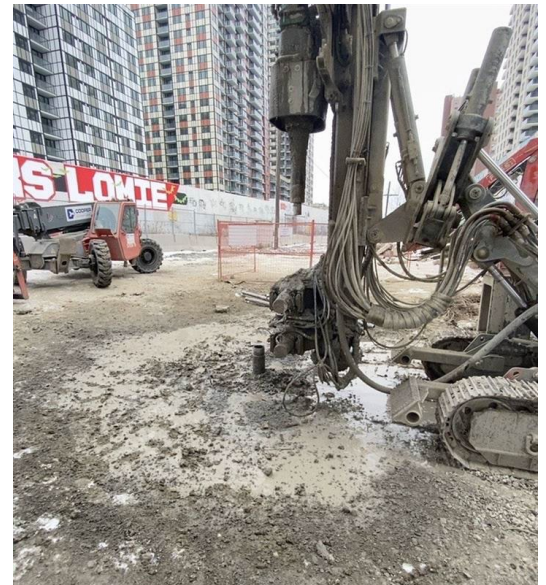

N° 5 Foreuse hydraulique utilisée dans le corridor ferroviaire

### 3. Travaux à venir ou travaux en cours

Au cours des 4 à 6 prochaines semaines, les travaux de construction devraient comprendre :

**Activité 1 : Construction de rampe d'accès au trottoir**

- **Lieu** : rue Dupont (entre les avenues Lansdowne et Campbell)
- **Calendrier** : Novembre 2025 – début 2027; du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h
- **Répercussions possibles** : Au cours de cette première phase des travaux, le trottoir, la piste cyclable et la voie de circulation en direction est sur le côté sud de la rue Dupont seront fermés. Des travaux de démolition, d'excavation, de nivellement, de raccordement aux réseaux et de bétonnage sont prévus pendant la durée des travaux.
- **Mesures d'atténuation** : Les résidents et les commerces du quartier pourraient être exposés à de la poussière, du bruit et des lumières provenant des véhicules, des équipements, des machines et des équipes de chantier. Tout sera mis en œuvre pour réduire au minimum ces répercussions dans la mesure du possible. Des mesures de régulation du trafic et une signalisation claire, tant pour les piétons que pour les automobilistes, seront mises en place le long de la rue Dupont. Veuillez suivre toutes les indications affichées à l'approche de la zone de travaux. Les équipes rafraîchiront également le marquage routier dans la zone de chantier selon les besoins tout au long du projet.

## Activité 2 : Construction de la passerelle piétonne et de la rampe d'accès

- **Lieu** : Travaux dans le corridor (au nord de la rue Dupont, à l'intérieur des corridors ferroviaires de Metrolinx et de la CPKC)
- **Calendrier** : Octobre 2025 – fin 2026; du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
- **Répercussions possibles** : Les travaux comprennent le forage, la pose de micropieux, l'excavation, le transport de matériaux, la mise en place des barres d'armature, l'installation de l'acier et le coulage du béton. Toutes ces activités seront menées à l'intérieur du corridor ferroviaire. Une partie du matériel et des matériaux sera acheminée sur le chantier par la porte d'accès au chantier située à l'angle du chemin Davenport et de l'avenue Foundry.
- **Mesures d'atténuation** : Les riverains et les commerces situés à proximité doivent s'attendre à subir des nuisances sonores, des vibrations et des nuages de poussière pendant la durée des travaux. Les équipes prendront les mesures nécessaires pour limiter ces nuisances.

## Activité 3 : Travaux sur les réseaux dans le corridor

- **Lieu** : Travaux dans le corridor (à l'intérieur des corridors ferroviaires de Metrolinx)
- **Calendrier** : Septembre 2025 – fin du projet; du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h
- **Répercussions possibles** : Les travaux comprennent l'excavation, la mise en place de la couche de fondation, la pose de canalisations, les essais et le revêtement en asphalte. Les équipes creuseront également des tranchées et installeront de nouveaux chemins de câbles dans le corridor.
- **Mesures d'atténuation** : Les résidents et les entreprises du secteur doivent s'attendre à un peu de poussière, de bruit et de lumière provenant des véhicules, des équipements, des machines et des équipes. Les équipes prendront les mesures nécessaires pour réduire les nuisances. Aucune répercussion n'est prévue sur l'approvisionnement en eau ou le service d'électricité.

### **Pourquoi ces travaux ont lieu maintenant :**

Ces travaux de construction majeurs s'inscrivent dans le cadre de la construction globale de la voie verte du saut-de-mouton de Davenport.

---

## **4. Perspectives**

La construction de la nouvelle passerelle piétonne se poursuivra au cours des prochains mois, avec notamment la mise en place d'une plate-forme de grue ainsi que l'installation et le montage de la structure de la passerelle au-dessus du corridor ferroviaire du CPKC. Ces travaux sont provisoirement prévus pour le printemps ou l'été 2026. Les résidents et les commerces locaux concernés seront informés à l'avance de ces travaux.

Metrolinx informera les résidents de tout changement important concernant les travaux de construction ou de leurs répercussions potentielles.

---

## **5. Restez branché**

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ces travaux, veuillez communiquer avec l'équipe chargée de l'engagement communautaire de Toronto Ouest :

- **Courriel :** [torontowest@metrolinx.com](mailto:torontowest@metrolinx.com)
- **Numéro de téléphone :** 416-202-6911

Abonnez-vous à notre bulletin d'information électronique pour rester à jour :

- [www.metrolinx.com/abonnez-vous](http://www.metrolinx.com/abonnez-vous)

Nous vous remercions de votre patience et de l'intérêt que vous continuez de nous porter tout au long des travaux.
