

## Expansion de GO – Toronto Ouest

### Mise à jour sur les travaux de construction

#### Mise à jour mensuelle sur les travaux de construction - Quatrième voie de Kitchener

Date : Le 9 avril 2026

Afin de permettre une augmentation de la fréquence des services sur la ligne Kitchener, des améliorations seront apportées le long du corridor ferroviaire et dans certaines gares existantes. La dernière série de travaux comprend la pose de voies ainsi que la modernisation de la gare GO de Bloor et du chemin de fer de Toronto Ouest, ce qui améliorera l'expérience des usagers et renforcera l'accessibilité et les correspondances au sein de la communauté.

Voici le point mensuel sur les travaux de construction du projet de construction de la **quatrième voie de Kitchener**. Il comprend un résumé des travaux réalisés au cours du mois écoulé, des activités à venir ou en cours, ainsi que des éventuelles répercussions sur la communauté dont les résidents et les commerces devraient être informés.

### 1. Travaux récemment achevés

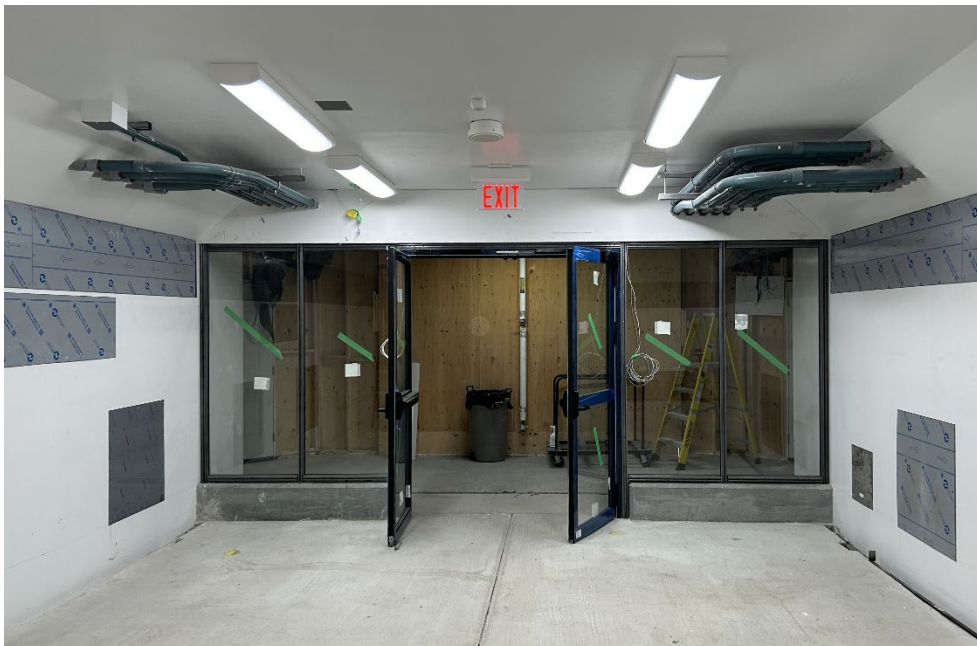


Figure 1 : Cloison et porte coupe-feu

- **Portes de jonction entre les tunnels** : Cloison et portes coupe-feu installées au niveau de la jonction entre le tunnel existant et le nouveau tunnel.
- **Construction des machines d'ascenseur et de la cabine** : Les machines d'ascenseur, les équipements de levage, la cabine, les portes et les entrées ont été installés.

- **Installation de la clôture** : De l'avenue Randolph à la rue Bloor
- **Installation du tapis de ballast** : De l'avenue Ernest au sud de la rue Bloor

## 2. Travaux à venir ou en cours

Au cours des 4 à 6 prochaines semaines, les travaux de construction devraient comprendre :

### Activité 1 : Essai des équipements électriques et mécaniques

- **Lieu** : Nouveau pavillon/tunnel piétonnier au bout de l'avenue Randolph
- **Période** : Jours de semaine
- **Répercussions possibles** : Aucune répercussion importante n'est prévue
- **Mesures d'atténuation** : Sans objet

#### Pourquoi ces travaux ont-ils lieu maintenant?

Les systèmes de distribution électrique, de CVC, de plomberie, d'éclairage et de sonorisation seront testés et réglés afin de s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement.



Figure 2 : Nouveau pavillon/tunnel piétonnier au bout de l'avenue Randolph

### Activité 2 : Installation des vitrages de la cage d'ascenseur

- **Lieu** : À l'intérieur du nouveau pavillon au bout de l'avenue Randolph
- **Période** : Jours de semaine
- **Répercussions possibles** : Aucune répercussion importante n'est prévue. L'accès à la gare GO de Bloor sera maintenu en permanence.
- **Mesures d'atténuation** : Sans objet

#### Pourquoi ces travaux ont-ils lieu maintenant?

Une fois les travaux terminés, les essais de l'ascenseur pourront commencer et les travaux de finition du plafond du pavillon pourront se poursuivre.


### Activité 3 : Construction de la voie

- **Lieu** : De l'avenue Ernest à la rue Dundas

- **Période** : Jours de semaine
- **Répercussions possibles** : Aucune répercussion importante n'est prévue. L'accès à la gare GO de Bloor sera maintenu en permanence.
- **Mesures d'atténuation** : Sans objet

### **Pourquoi ces travaux ont-ils lieu maintenant?**

Une fois les tapis de ballast installés, les équipes commenceront à poser le ballast et à construire la voie depuis l'avenue Ernest en direction de la rue Dundas.

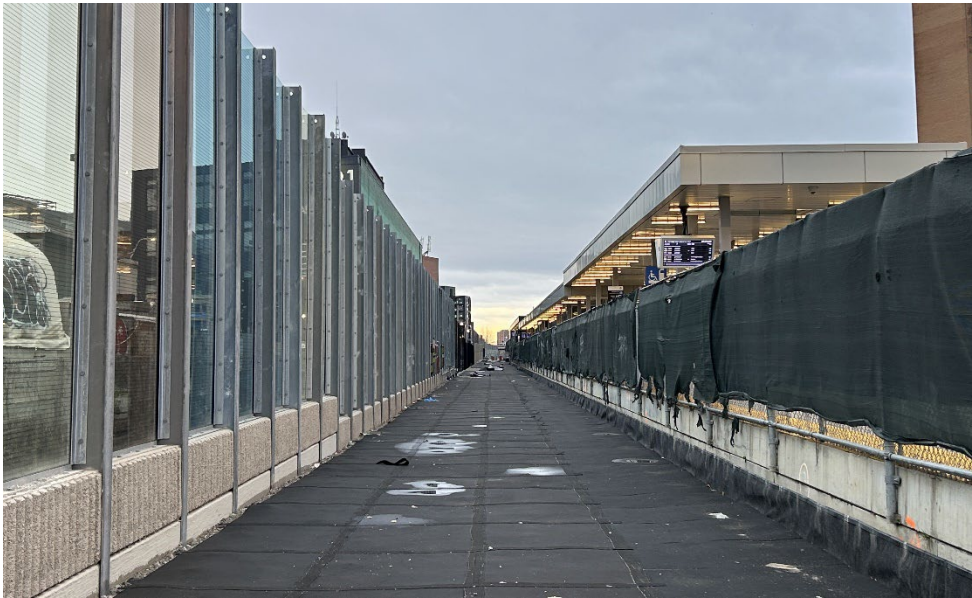

*Tableau 3 : Voie ferrée de l'avenue Ernest, face à la rue Dundas*

## **3. Perspectives**

Les travaux du pavillon et du tunnel sont actuellement en phase de finition, et la construction de l'ascenseur touche à sa fin. Les travaux se poursuivront sur les éléments architecturaux ainsi que sur les essais et la mise en service des systèmes électriques et mécaniques. Les travaux de réaménagement de la voie ferrée (pavage, plantation, etc.) entre l'avenue Ernest et la rue Bloor débuteront au printemps. Nous continuerons à vous informer à l'avance de tout changement important concernant les travaux de construction ou de toute répercussion potentielle.

## **4. Restez informés**

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ces travaux, veuillez communiquer avec l'équipe chargée de l'engagement communautaire de Toronto-Ouest :

- **Courriel** : [torontowest@metrolinx.com](mailto:torontowest@metrolinx.com)
- **Numéro de téléphone** : 416-202-6911

Abonnez-vous à notre bulletin d'information électronique pour rester informés :  
[www.metrolinx.com/subscribe](http://www.metrolinx.com/subscribe)

---

Merci de votre patience et de votre intérêt tout au long de l'avancement des travaux.
